



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V.

**ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL EJERCICIO 2026.**

En el Puerto de Topolobampo, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del 29 de Enero de 2026, en la Sala de Juntas de las Oficinas Administrativas se reunieron los integrantes:

I.- Lista de asistencia y verificación del Quórum.

LCP MARIO GUSTAVO MONTESINOS VALENZUELA
ING. MOISES FLORES BONILLA
ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM
MTRA. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ
ING. JASSIEL ESTRADA VALENCIA
LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA
LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA
LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA

PRESIDENTE
SECRETARIO TÉCNICO
VOCAL A
VOCAL B
VOCAL C
VOCAL D
ASESOR A
ASESOR B

El Presidente, en base a la lista de asistencia y toda vez que constató que había quórum declaró legalmente instalada la primera sesión ordinaria del Comité de Obra Pública del ejercicio 2026.

Invitados al Evento:

Ing. Saúl Gill León Departamento de Proyectos y Construcción, ASIPONA Topolobampo.

II.- Lectura y aprobación del orden del día.

Los presentes aprobaron el orden del día de la sesión, el cual se consigna a continuación:

- I. Lista de asistencia y verificación del Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Lectura y aprobación del acta anterior.
- IV. Asuntos a tratar:
 - IV.I.- Convenios formalizados durante el 4to trimestre del ejercicio 2025, (1ero de Diciembre al 31 de Diciembre del 2025).
 - IV.II.- Avance Financiero Periodo (1ero de Diciembre al 31 de Diciembre del 2025).
 - IV.III.- Porcentajes 70 -30 Presupuesto Asignado Ejercicio 2025, Partidas Presupuestales 62601.- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA y 62602.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADAS.
 - IV. IV.- Programa Anual de Obra Pública 2026.





- V. Asuntos Generales.
VI. Cierre de la Sesión.

III.- Lectura y aprobación del acta anterior

IV.- Asuntos a tratar.

IV.I.- Convenios formalizados durante el 4to trimestre del ejercicio 2025, (1ero de Diciembre al 31 de Diciembre del 2025).

TIPO DE PROCEDIMIENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	NO. CONVENIO	FIRMA DE CONVENIO	CONVENIO (PLAZO)	CONVENIO EN MONTO
AD	ASIPONA-TOPO-SROP-08-24-CM3	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025-2028	3	11/12/2025	N/A	-\$ 62,500.00
LP	ASIPONA-TOPO-OP-04-25-CM1	CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.	ADECUACION DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO (VIALIDADES, SEÑALIZACION PREVENTIVA, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO)	1	18/12/2025	21/12/2025 al 27/12/2025	\$ 1,391,950.34
LP	ASIPONA-TOPO-OP-05-25-CM1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025	1	18/12/2025	21/12/2025 al 27/12/2025	\$ 1,220,511.56
LP	ASIPONA-TOPO-SROP-07-25-CM1	CONSTRUCTORA INGENIERILES MARINA S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL DE LA OBRA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO	1	15/12/2025	DISMINUCIÓN DE 5 DIAS DEL 20 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2025	-\$ 53,350.90

IV.II.- Avance Financiero Periodo (1ero de Diciembre al 31 de Diciembre del 2025).

CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin iva)	MONTO EJECUTADO DICIEMBRE 2025	N° ESTIMACION	IMPORTE POR ESTIMACION
ASIPONA-TOPO-SROP-08-24	04/12/2024	EVALUAR PARA DECIDIR S.A.S DE C.V.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, FICHAS Y FACTIBILIDADES PARA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025-2028	\$ 250,000.00	\$ 187,500.00	1	\$ 125,000.00
						2	\$ 62,500.00
ASIPONA-TOPO-SROP-02-25	27/03/2025	INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE IMA S.A. DE C.V.	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO DE AREAS NAVEGABLES, CANAL PRINCIPAL DE ACCESO, DARSENA DE OPERACIONES, DARSENA DE APROXIMACIÓN, DE MUELLES 1, 2 Y 3, ASÍ COMO DE MUELLE DE TRANSBORDADORES Y MUELLE GENERAL EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, SINALOA	\$ 1,393,494.14	\$ 507,596.39	4	\$ 507,596.39



CONTRATO	FECHA CONTRATO	CONTRATISTA	CONCEPTO	IMPORTE CONTRATADO (sin IVA)	MONTO EJECUTADO DICIEMBRE 2025	N° ESTIMACION	IMPORTE POR ESTIMACION
ASIPONA-TOPO-OP-04-25	03/10/2025	CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.	ADECUACION DE LAS VIALIDADES DEL RECINTO PORTUARIO DE TOPOLOBAMPO (VIALIDADES, SEÑALIZACION PREVENTIVA, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO)	\$ 9,487,332.10	\$ 9,671,646.90	2	\$ 5,519,421.67
						3	\$ 2,073,503.12
						4 CM1	\$ 2,078,722.11
ASIPONA-TOPO-OP-05-25	10/10/2025	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LM S.A. DE C.V.	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 2025	\$ 4,372,978.92	\$ 3,937,677.69	3	\$ 717,722.980
						4	\$ 1,751,410.200
						5 (1CM1)	\$ 1,468,544.510
ASIPONA-TOPO-OP-06-25	10/10/2025	MEXICANA DE DRAGADOS S.A. DE C.V. MDR9312139UA	DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACION EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO	\$ 129,223,832.49	\$ 159,419,669.76	1	\$ 83,847,075.830
						2	\$ 45,376,756.660
						1.CM1	\$ 30,195,837.270
ASIPONA-TOPO-SROP-07-25	10/10/2025	CONSTRUCTORA INGENIERILES MARINA S.A. DE C.V.	SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL DE LA OBRA DE DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DE NAVEGACION EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO	\$ 4,634,579.69	\$ 2,358,994.67	2	\$ 1,163,891.000
						3	\$ 1,195,103.670





IV.III.- Porcentajes 70 -30 Presupuesto Asignado Ejercicio 2025, Partidas Presupuestales 62601.- OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA y 62602.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADAS.

Porcentajes del 70 - 30			
PPTO.	ASIGNADO 2025. - PARTIDA PRES. 60000	LP Art. 42	ITP Y AD Art. 43
\$	192, 588, 300. 00	\$186, 604, 383. 13	\$ 677, 058. 31
MONTO CONTRATADO POR EJERCER		96. 89%	0. 35%
\$	5,306,858.56		
	2. 76%		

IV. IV.-Programa Anual de Obra Pública 2026.
VER ANEXO 1.

V.- Asuntos Generales.

Comentarios por parte de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería, a cargo del Ing. Ramiro Jesús Cota Gastelum (Vocal A de este comité), hace mención sobre la adecuación presupuestal para la AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE GRANELES (POSICIÓN NO. 3), misma que se solicitó a el área de Finanzas, y que se encuentran trabajando en el procedimiento de Licitación Pública, mismo que se desde lanzar en los meses de Marzo – Abril.

Por parte de la Gerencia de Administración y Finanzas, a cargo del LCP Mario Gustavo Montesinos Valenzuela (Presidente de este comité), menciona con relación al Programa Anual de Obra, si se autorizan modificaciones de acuerdo a las Gestiones ante la Unidad de Inversión, se pueden realizar mes con mes las modificaciones pertinentes en dicho Programa, mismo que se cargaran en el PAAASOP y en la Página del Puerto.

En uso de la Voz, por parte del Órgano Interno De Control, a cargo de la LIC. Elvia Lourdes Martin Mata, se exhorta a Cumplir, con la carga de las actas de las sesiones del Comité de Obra Pública, así como los Programas de Obra Pública del ejercicio, en la Página oficial del Puerto.

VI.- Cierre de la sesión.


No habiendo más que hacer constar en la presente sesión ordinaria se da por concluida la presente sesión del Comité de Obra Pública siendo las 10:18 horas del mismo día, levantándose en original y copia, entregándose una copia perfectamente legible a cada participante, la cual una vez leída y ratificada se firma de conformidad.





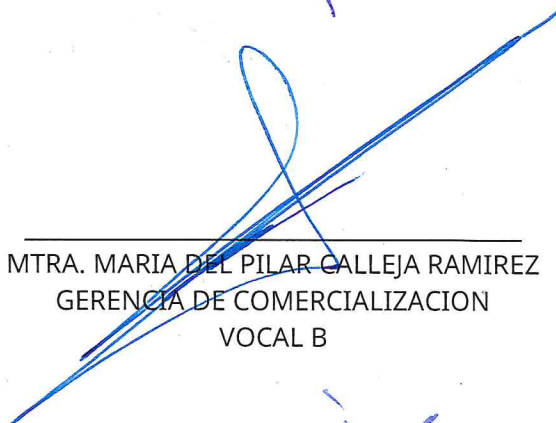
Marina
Secretaría de Marina





LCP. MARIO GUSTAVO MONTESINOS
VALENZUELA
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESIDENTE



ING. MOISES FLORES BONILLA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA
SECRETARIO TECNICO



ING. RAMIRO JESUS COTA GASTELUM
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
VOCAL A


MTRA. MARIA DEL PILAR CALLEJA RAMIREZ
GERENCIA DE COMERCIALIZACION
VOCAL B


ING. JASSIEL ESTRADA VALENCIA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
VOCAL C


LIC. JOAQUIN VIZCARRA LEYVA
SUBGERENCIA DE FINANZAS
VOCAL D


LIC. ELVIA LOURDES MARTIN MATA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASESOR A


LIC. PAUL ESTRELLA ZAMORA
DEPARTAMENTO JURIDICO
ASESOR B



2026
año de
Margarita
Maza



INVITADOS

ING. SAÚL GIL LEÓN (INVITADO)
DEPARTAMENTO PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN

LIC. DAVID JACOBO ARMENTA VALENZUELA
(INVITADO)
AUDITOR ORGANO INTERNO DE CONTROL

